

TOTEUTUSSUUNNITELMA KUNINKAANTAMMEN LAMMENRANNAN RAKENTAMISESTA

Sijainti yhdyskuntarakenteessa, asemakaavatilanne ja liikennejärjestelyt

Kuninkaantammen projektialueeseen kuuluva Lammenrannan alue sijaitsee Koillis-Helsingissä, Kaarelan kaupunginosassa, noin 10 km etäisyydellä keskustasta. Alue rajautuu etelässä Keskuspuistoon ja Helene Schjerfbeckin puistoon, idässä Keskuspuistoon, pohjoisessa Pitkäläkosken vedenpuhdistuslaitoksen alueeseen (Kuninkaantammentien ympäristön kaava-alue) ja lännessä rakenteilla olevaan Kuninkaantammen keskustan kaava-alueeseen.

Lammenrannan asemakaava (numero 12401) hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 30.8.2017. Asemakaava on lainvoimainen.

Lammenrannan kadut Paletinkierro ja Vedenkierto ovat tonttikatuja. Palettikatu on jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu. Alueen puistoja ovat Vennynpuisto ja Ellen Thesleffin puisto uimalampineen.

Alueen asemakaava ja havainnekuva ovat toteutussuunnitelman **liitteinä 1a ja 1b**.

Väestön ja työpaikkojen kehitys vuosina 2020 – 2026

Lammenrannan alueelle rakennetaan pääosin asuntoja. Alueelle rakennetaan yhteensä noin 530 asuntoa. Asuntorakentaminen alueella alkaa aikaisintaan vuoden 2021 lopulla. Viimeisten asuntojen arvioidaan valmistuvan vuonna 2026. Alueen valmistuttua Lammenrannan alueella arvioidaan olevan noin 950 asukasta. Pääosa asunnoista valmistuu vuoden 2023 jälkeen.

Väestö- ja työpaikkatavoite on esitetty **liitteessä 2**.

Asuntotuotannon määrä-, hallintamuoto- ja talotyyppitavoitteet vuosina 2020 – 2026

Alueelle on kaavoitettu noin 38 300 k-m² uutta asuinkerrosalaa.

Asuntotuotannon määrät hallintamuodoittain ja talotyypeittäin on esitetty **liitteessä 2**.

ARA-tuotannon osuus

ARA-tuotannon (ara-vuokra ja asumisoikeus) osuus on tämän hetkisen arvion mukaan noin 70 % koko alueen asuntotuotannosta, mikä vastaa noin 375 asuntoa, joista arviolta noin 140 on ARA-vuokra-asuntoja ja 235 asumisoikeusasuntoja.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa kaikki kaava-alueen tontit.

Katujen, siltojen ja puistojen rakentamisen kustannukset ja aikataulu

Alueen katualueiden rakentamisen kustannukset vuosina 2020 – 2023 ovat yhteensä noin 3,61 milj. euroa, ja katurakentamisen kokonaiskustannukset vuosina 2020-26 ovat yhteensä noin 4,86 milj. euroa. Puistoalueiden rakentamisen kustannukset vuosina 2020 – 2023 ovat yhteensä noin 7,98 milj. euroa, ja puistorakentamisen kokonaiskustannukset vuosina 2020-26 ovat yhteensä noin 13,6 milj. euroa.

Katujen ja puistojen rakentamiseen liittyy maaperän esirakentamista (stabilointia, esikuormituspenger- ja täyttötöitä, pilaantuneen maaperän kunnostusta). Kaupungin investointikustannukset ovat etupainotteisia asuntorakentamiseen nähden. Vuosittaiset rakentamiskustannukset on esitetty **liitteessä 3**.

Alueen rakentamisaikataulu on katujen ja puistojen osalta seuraava:

Katujen suunnittelu vuosina 2019-20

Katujen esirakentaminen ja rakentaminen vuosina 2020 – 2023 (tonttien rakentamiskelpoisuuden edellyttämään tasoon)

Lopullisesti kadut valmistuvat istutuksineen, kalustuksineen ja viimeistelyinen pintoineen asuntorakentamisen tahdissa.

Puistojen suunnittelu vuosina 2018-22

Puistojen esirakentaminen ja rakentaminen vuosina 2020 – 2025

Lopullisesti puistot valmistuvat istutuksineen, kalustuksineen ja viimeistelyinen pintoineen asuntorakentamisen tahdissa.


Avustuksen vaikutus alueen asuntotuotannon ja hankkeiden aikaistamiseen

Lammenranta on entistä vedenpuhdistuslaitoksen aluetta ja täyttömaata, jonka rakentaminen maaperän kunnostuksineen on vaativaa ja kallista. Haasteelliset lähtökohdat lisäävät alueen rakentamisesta kaupungille aiheutuvia kustannuksia, minkä takia takia avustuksen vaikutus alueen rakentamisen aikatauluun olisi merkittävä.


Liitteet

- | | |
|----|---|
| 1a | Asemakaavakartta |
| 1b | Asemakaavan havainnekuva |
| 2 | Väestö- ja työpaikkatavoite sekä asuntotuotannon määrä-, hallintamuoto- ja talotyyppitavoitteet |
| 3 | Katujen ja puistojen rakentamiskustannusarvio |

LIITE 1a: Lammenrannan asemakaava (12401)

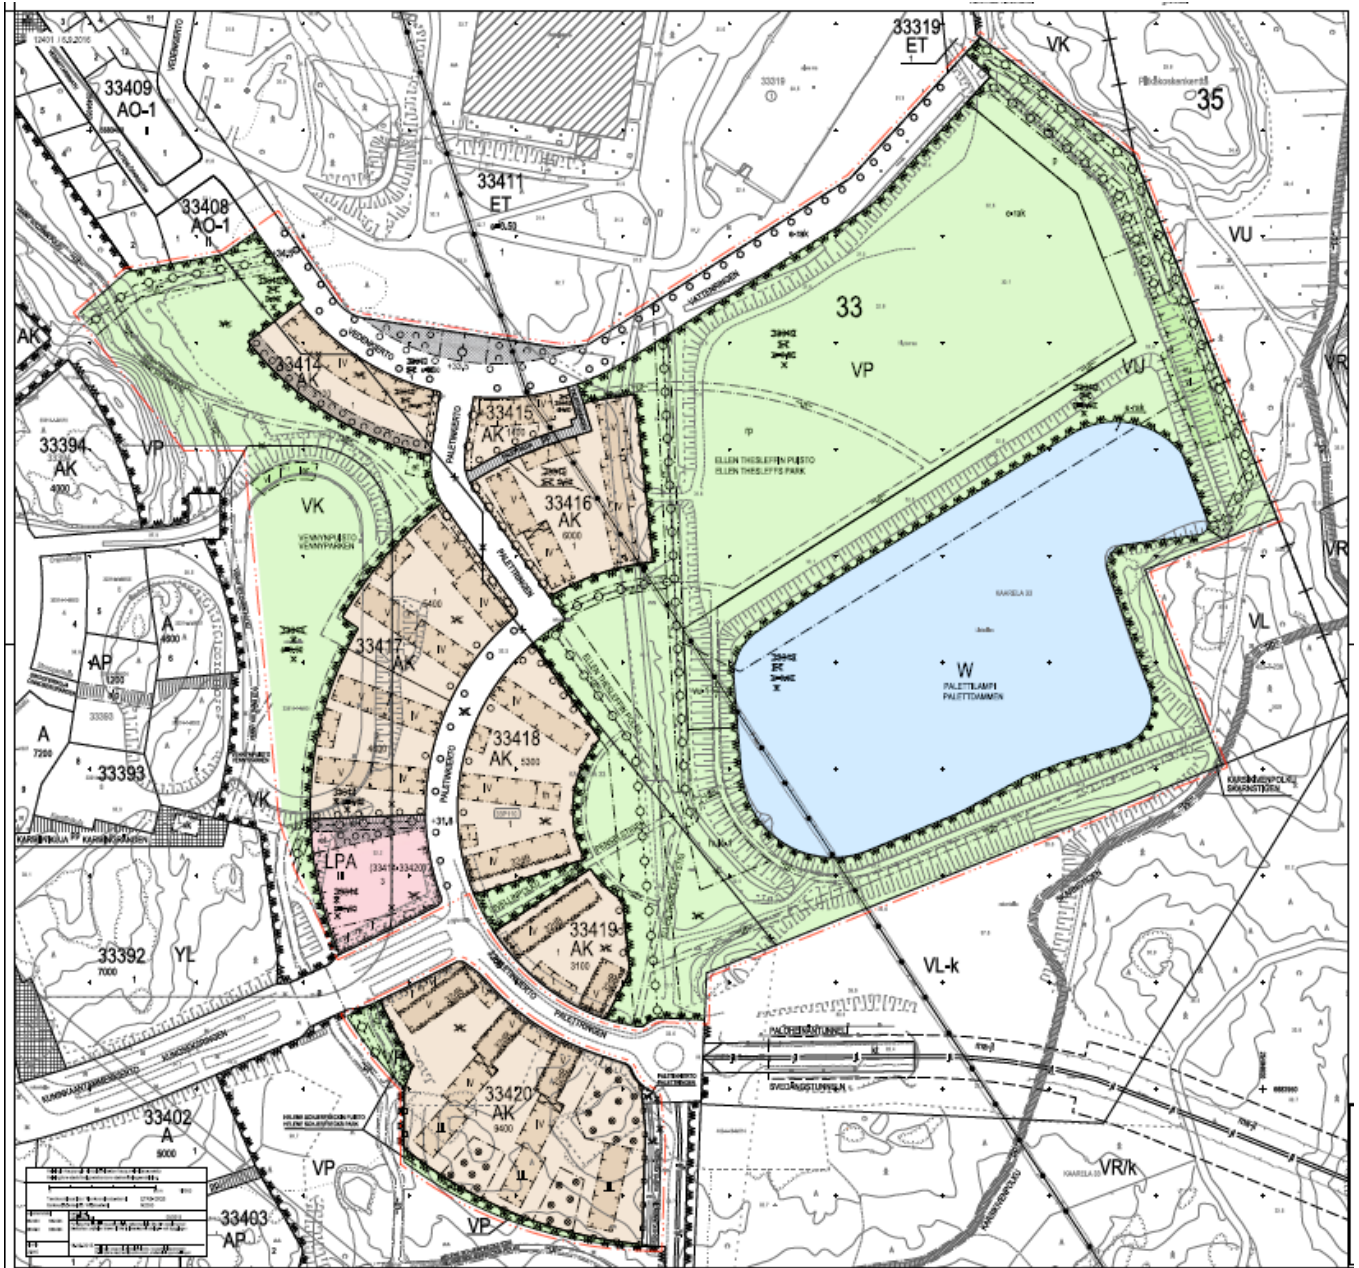

LIITE 1b: Lammenrannan asemakaavan (12401) havainnekuva

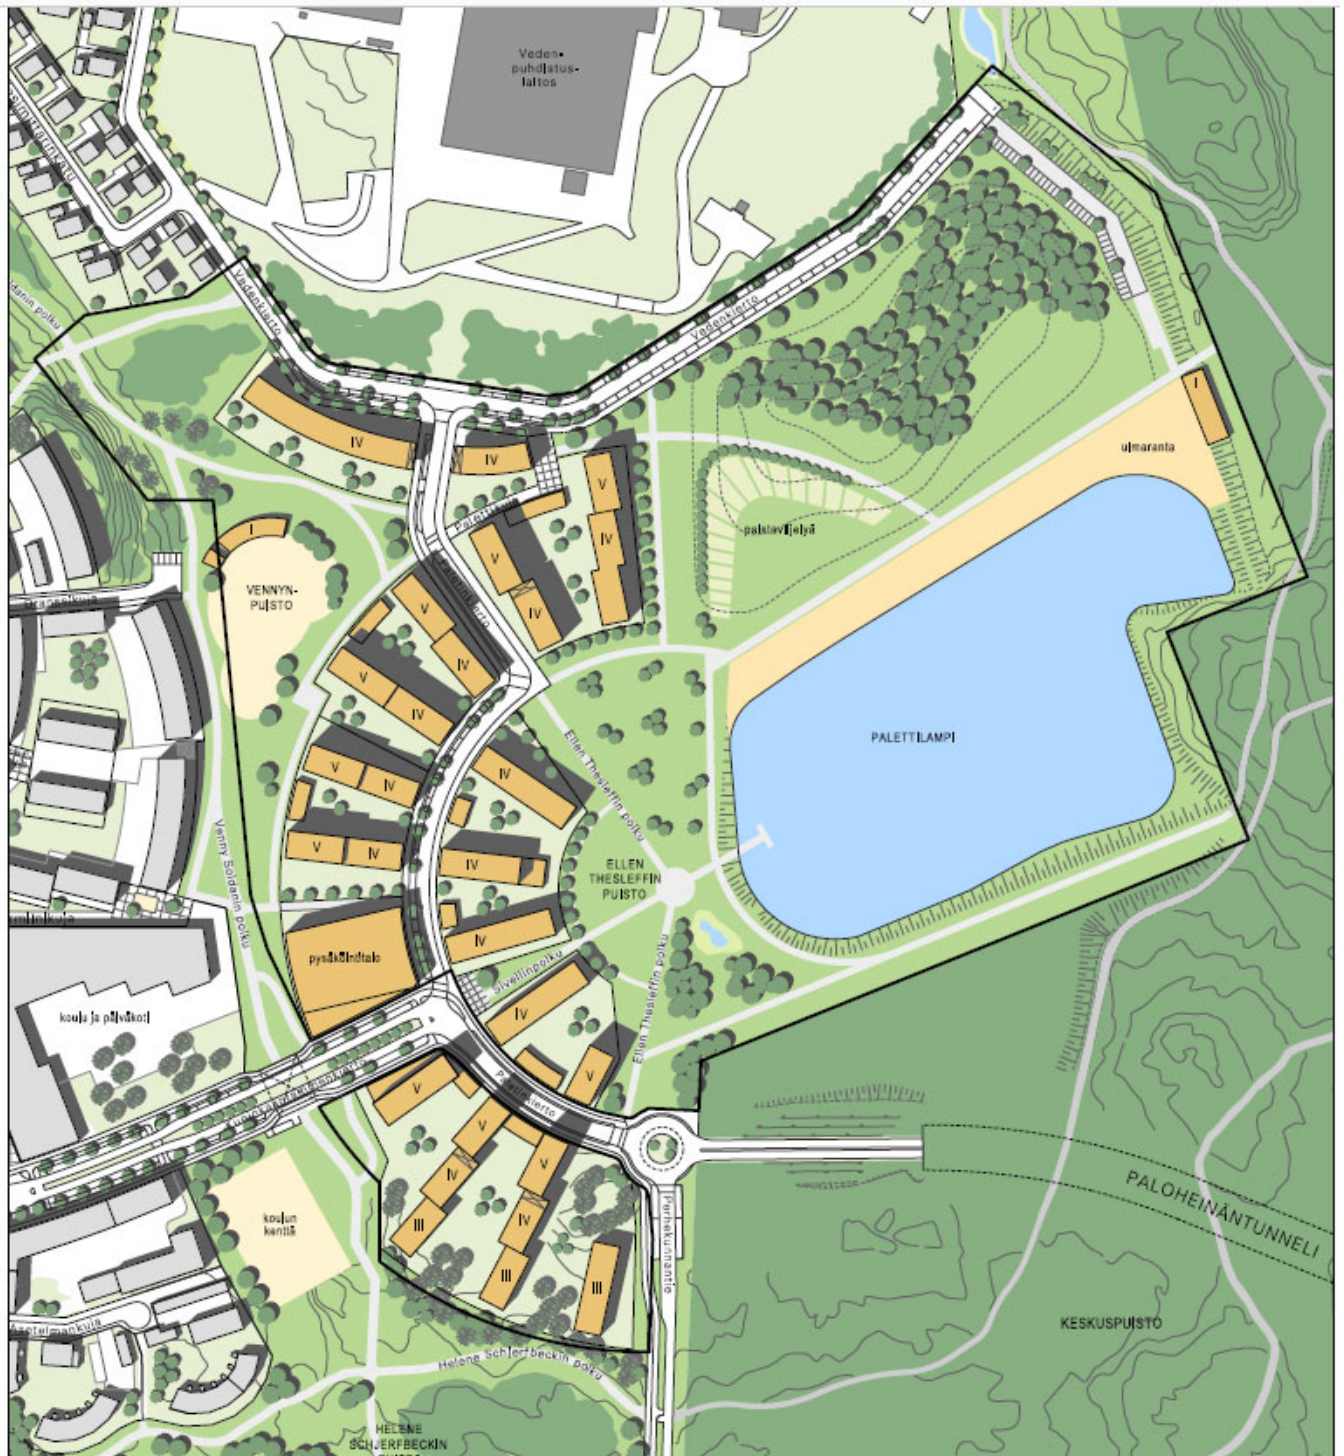

LIITE 2: Lammenrannan väestö- ja työpaikkatavoite sekä asuntotuotannon määrä-, hallintamuo- to- ja talotyyppitavoitteet vuoteen 2026 mennessä

Vuosi	Väestötavoite	Työpaikkata-	Asuntotuotanto				Asuntomäärät	
	vuoden	voite vuoden	Aloituvuosittain (asuntoa)				talotyypeittäin	
	lopussa	lopussa	Vaparah.	ARA-vuokra	Asumisoik.	Yhteensä	Kerrostalo	Pientalo
	(kpl)	(kpl)	(kpl)	(kpl)	(kpl)	(kpl)	(kpl)	(kpl)
2020	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	67	65	132	132	0
2022	0	0	74	75	109	258	258	0
2023	235	5	42	0	59	101	101	0
2024	695	0	41	0	0	41	41	0
2025	875	0	0	0	0	0	0	0
2026	950	0	0	0	0	0	0	0
Yht.	950	5	157	142	233	532	532	0

LIITE 3: Lammenrannan katujen ja puistojen rakentamiskustannusarvio

	Katualueiden suunnittelu ja rakentaminen	Puistoalueiden suunnittelu ja rakentaminen
Vuosi	(milj. euroa)	(milj. euroa)
2020	0,99	2,02
2021	1,34	2,54
2022	0,64	0,43
2023	0,64	2,99
2024	0,05	3,18
2025	0,24	2,44
2026	0,96	0
Yhteensä	4,86	13,6
