

Muutossopimus hankintasopimukseen Sopimus sovelluksen toimittamisesta kokonaispalveluna, Vuoka (21.11.2019)

1 Sopijapuolet

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala (jäljempänä Tilaaja)
Osoite: Työpajankatu 8, 00580 Helsinki / PL 58205, 00099 Helsingin kaupunki
y-tunnus: 0201256-6

Visma Tampuuri Oy (jäljempänä Toimittaja)
Osoite: Keskuskatu 3, 00100 Helsinki
y-tunnus: 2081687-5

2 Alkuperäinen hankintasopimus

Hankintasopimuksen tarkoituksena on sopia hankintapäätöksessä HEL 2019-003108 tarkoitetun sovelluspalvelun hankinnasta, jonka toimittaja toimittaa tilaajalle. Hankintasopimuksen kohteena on kokonaispalvelu sisältäen Vuoka –sovelluksen ja siihen liittyvät jatkuvat palvelut.

3 Sopimusmuutokset

Hankintasopimuksen osapuolet (tilaaja Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala sekä toimittaja Visma Tampuuri Oy) ovat yhdessä sopineet käyttöönoton ajankohdasta toisin kuin 21.11.2019 allekirjoitetussa hankintasopimuksessa on määriteltä. Asiaa käsiteltiin sovelluspalvelun (myöhemmin palvelu) käyttöönoton ohjausryhmässä 30.6.2021. Tässä esitetty muutos on ohjausryhmän keskustelun mukainen.

Hankintasopimuksen kohdan 4.2 mukaan käyttöönoton pitää tapahtua viimeistään 24 kk kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Lisäksi kohdassa 4.2 (9) todetaan, että mikäli palvelua ei voida ottaa kokonaisuudessaan käyttöön toimittajasta johtuvasta syystä viimeistään kolmen (3) kalenterikuukauden kuluessa yllä mainitusta ajankohdasta, pidetään viivästyistä olennaisena sopimusrikkomuksena.


Lisäksi hankintasopimuksen kohdassa 4.3 (4) todetaan, että toimittajan tulee luovuttaa sovellus lopulliseen hyväksymistestaukseen viimeistään 23 kuukauden kuluessa siitä, kun sopimus on allekirjoitettu.

Käyttöönottoprojektin loppuvaiheessa tilaajalle on asuntopalvelujen osalta tullut kolmannelta osapuolelta johtuva tarve siirtää käyttöönottoa projektisuunnitelmassa sovitusta ajankohdasta. Siirrosta on yhdessä toimittajan kanssa neuvoteltu niin, että uusi käyttöönottoaika on marraskuussa 2021. Lisäksi tilaaja on asuntoyksikön (ent.

asuntovuokraus) toimintaan liittyen estynyt ottamaan järjestelmää käyttöön kesken vuotuisen vuokratarkistusprosessin, joka ajoittuu lokakuulta joulukuulle. Lisäksi asuntoyksikkö ei itse saa riittäväällä luotettavuudella läpikäytyä hyväksymistestausta ennen marras-joulukuuta 2021. Siirrosta on yhdessä toimittajan kanssa neuvoteltu niin, että uusi käyttöönottoaika on helmikuussa 2022.

Hankintarenkaan osapuolten päällekkäisestä käyttöönottoaikataulusta johtuen toimittajalla voi olla haasteita huolehtia resurssien riittävydestä ja sovelluspalvelun käyttöönotetun osion toimintavarmuudesta. Myös tästä riskienhallinnan näkökulmasta käsin käyttöönottoaikataulun muutokset hankintasopimuksessa todettuihin ovat perusteltuja.

Hyväksymistestauksen ja käyttöönoton vaiheista on tilaajan ja toimittajan yhteisymmärryksessä tehty oheinen uusi täsmennetty aikataulu, jonka molemminpuolisesta hyväksymisestä on neuvoteltu palvelun käyttöönoton ohjausryhmässä 30.6.2021.

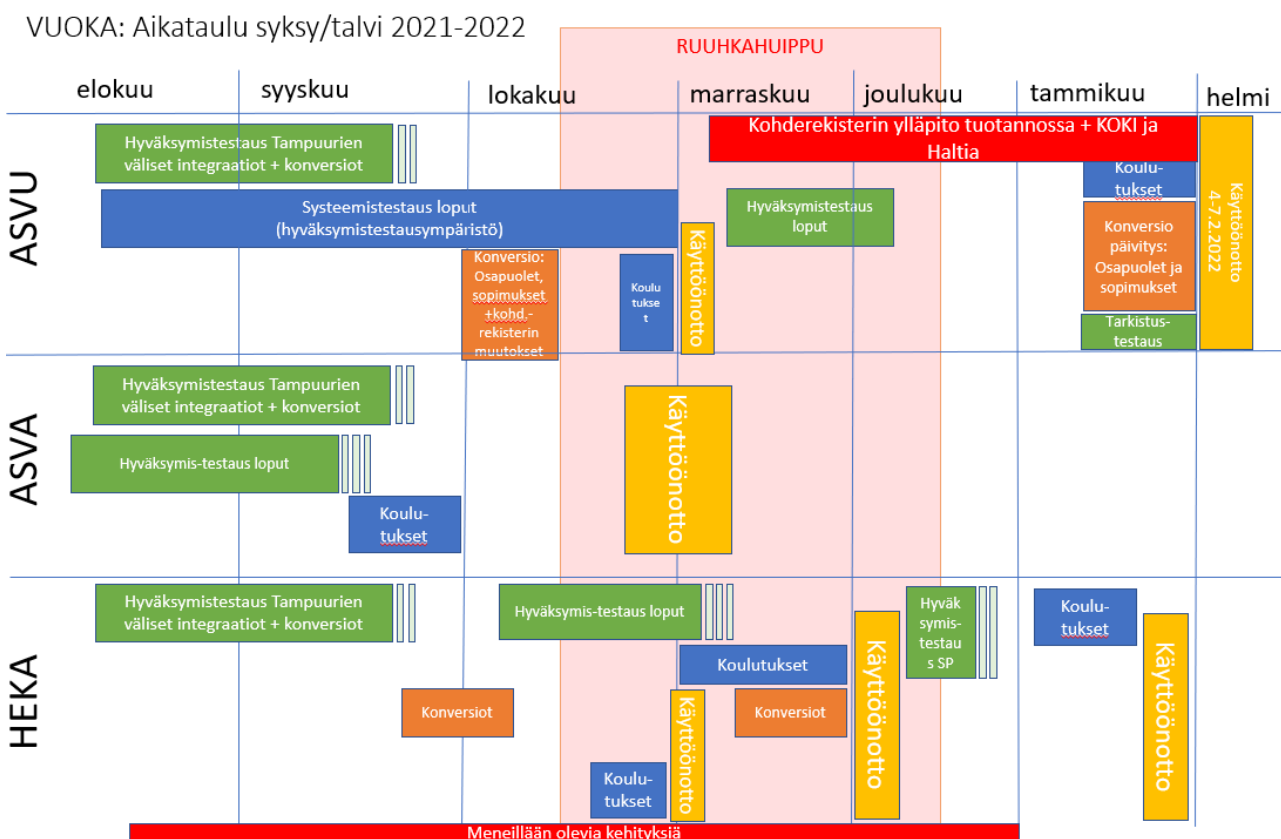

Jos käyttöönotto myöhästyy toimittajasta johtuvista syistä tässä muutossopimuksessa mainituista ajankohdista, sovelletaan tilanteessa alkuperäisen hankintasopimuksen ehtoja.

24. Sopimuskappaleet ja allekirjoitukset

Tätä sopimusta on laadittu kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.

Helsinki xx.xx.2021.

Tilaaja

Toimittaja

(allekirjoitus)
